ID		% Complete	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**20%**	**Commission de Révision des dépenses et des services**	**701 days?**	**Mon 12-01-30**	**Mon 14-10-06**	
2							
3		0%	Début des travaux de la Commission	0 days	Mon 12-01-30	Mon 12-01-30	
4							
5	✓	**100%**	**Planification et organisation**	**34 days**	**Mon 12-01-30**	**Thu 12-03-15**	
6	✓	100%	Identifier les livrables attendus	34 days	Mon 12-01-30	Thu 12-03-15	
7	✓	100%	Définir le plan de travail de la Commission	34 days	Mon 12-01-30	Thu 12-03-15	
8							
9		**49%**	**Initiation des travaux**	**137 days**	**Fri 12-03-16**	**Mon 12-09-24**	**5**
10	✓	100%	Rencontre avec les intervenants clé de la Ville	39 days	Fri 12-03-16	Wed 12-05-09	
11	✓	100%	Constats préliminaires	19 days	Fri 12-04-13	Wed 12-05-09	10FF
12		0%	Rencontres supplémentaires	60 days	Tue 12-07-03	Mon 12-09-24	
13							
14							
15		**4%**	**Ateliers de travail**	**531 days**	**Fri 12-03-30**	**Fri 14-04-11**	
66							
67		**23%**	**Rencontres de la Commission**	**566 days**	**Fri 12-03-16**	**Fri 14-05-16**	
68	✓	100%	Rencontres de la Commission 1	1 day	Fri 12-03-16	Fri 12-03-16	
69	✓	100%	Rencontres de la Commission 2	1 day	Fri 12-06-08	Fri 12-06-08	
70	✓	100%	Rencontres de la Commission 3	1 day	Thu 12-06-21	Thu 12-06-21	
71		0%	Rencontres de la Commission 4	1 day	Fri 12-11-16	Fri 12-11-16	
72		0%	Rencontres de la Commission 5	1 day	Fri 13-01-18	Fri 13-01-18	
73		0%	Rencontres de la Commission 6	1 day	Fri 13-03-15	Fri 13-03-15	
74		0%	Rencontres de la Commission 7	1 day	Fri 13-05-17	Fri 13-05-17	
75		0%	Rencontres de la Commission 8	1 day	Fri 13-07-19	Fri 13-07-19	
76		0%	Rencontres de la Commission 9	1 day	Fri 13-09-20	Fri 13-09-20	
77		0%	Rencontres de la Commission 10	1 day	Fri 13-11-15	Fri 13-11-15	
78		0%	Rencontres de la Commission 11	1 day	Fri 14-01-17	Fri 14-01-17	
79		0%	Rencontres de la Commission 12	1 day	Fri 14-03-21	Fri 14-03-21	
80		0%	Rencontres de la Commission 13	1 day	Fri 14-05-16	Fri 14-05-16	
81							
82		**24%**	**Diagnostic**	**292 days**	**Fri 12-03-16**	**Mon 13-04-29**	**5**
83	✓	100%	Appel d'offres	70 days	Fri 12-03-16	Thu 12-06-21	
84		0%	Travaux de la firme conseil	222 days	Fri 12-06-22	Mon 13-04-29	83
85							
86		**0%**	**Élaboration du plan d'intervention**	**75 days?**	**Tue 13-04-30**	**Mon 13-08-12**	**82**
87		0%	Réflexion	15 days	Tue 13-04-30	Mon 13-05-20	
88		0%	Mise en place et intégration au budget	60 days?	Tue 13-05-21	Mon 13-08-12	87
89							
90		**50%**	**Présentation au Conseil municipal**	**297 days**	**Mon 12-04-02**	**Tue 13-05-21**	
91	✓	100%	Première présentation	1 day	Mon 12-04-02	Mon 12-04-02	
92		0%	Deuxième présentation	1 day	Tue 13-05-21	Tue 13-05-21	87
93							
94		0%	Réalisation du plan d'intervention	200 days?	Tue 13-08-13	Mon 14-05-19	86
95							
96		0%	Mesures et suivi du plan d'intervention	200 days?	Tue 13-12-31	Mon 14-10-06	94SS+100 days

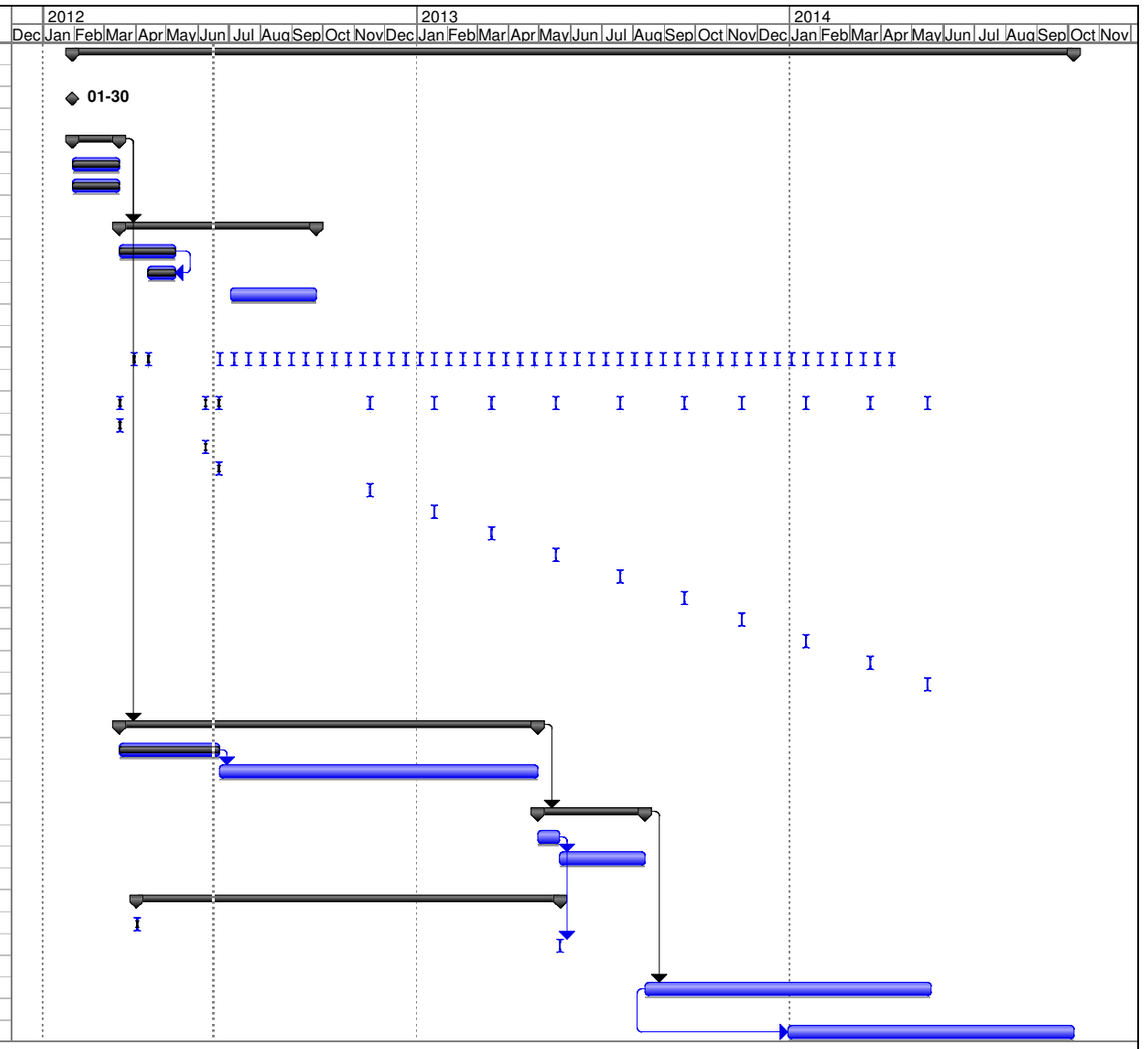

Project: CRDS PLan global 120615
Date: Fri 12-06-15

Task — Progress — Summary — External Tasks — Deadline
Split — Milestone — Project Summary — External Milestone
